


운동장 평도면

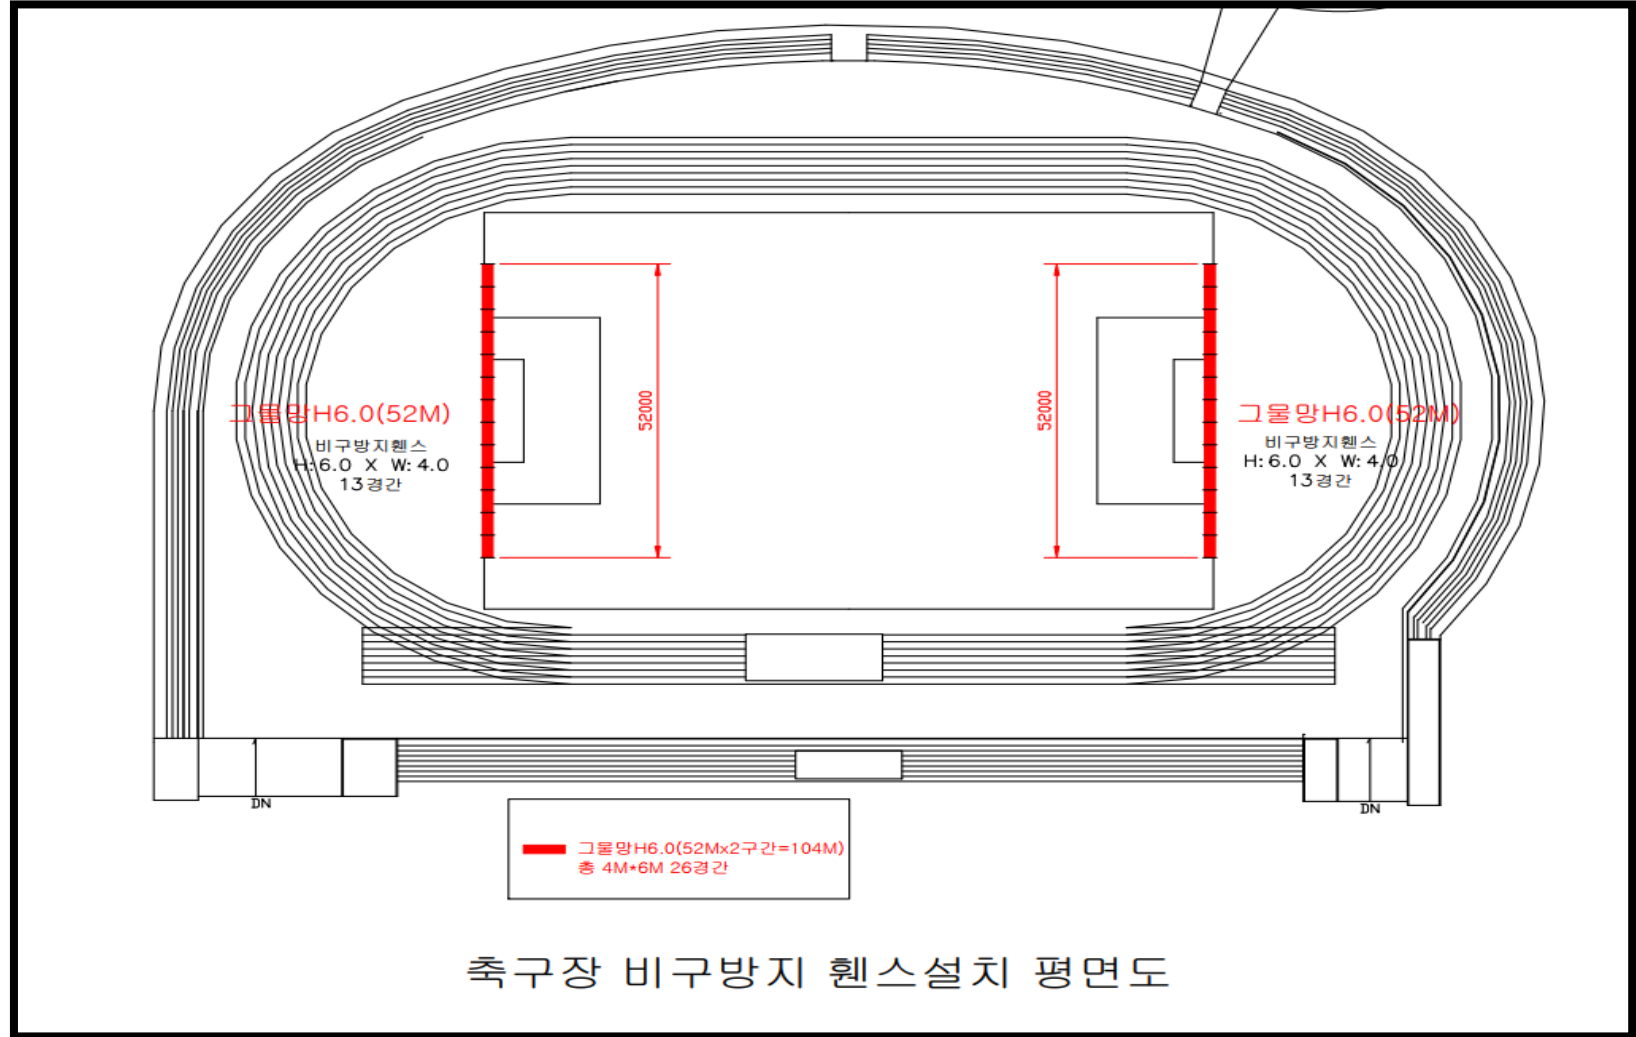

공사명

축구장 비구방지휀스 설치공사

현장사진



■. 공사 계획

1. 그물망웬스(W4000*H6000) 26경간 설치(골대 뒤 52M*양쪽=104M)
 - 매 주주당 보조지주 설치, 매설 지주높이 0.7M로 주주대 총 높이 6.7M
 - 보조구장쪽에 웬스 시공
2. 안전패드 설치
 - 2줄 안전패드 : H160*T20mm*4000
 - 보조지주 쿠션(H1800*T45mm) 26개소, 주지주 쿠션 (H500*T45mm) 26개소
 - 안전패드 한남대학교 디자인 및 문자로고
3. 기존 콘크리트 바닥 컷팅, 터파기 후 주주/보조주주 기초 콘크리트 타설
4. 기초 부분 인조잔디 원상복구, 폐기물처리, 스카이장비대 포함
5. 기타가설공사
 - 공사 안내 현수막 설치(1m*8m, 2개소 이상)
 - 작업 간 현장주변 사람 통행 금지 안전웬스 설치하여 안전하게 작업진행

공사명

축구장 비구방지웬스 설치공사

타현장 설치 사진



디자인 로고 및 문자

공사명

축구장 비구방지헨스 설치공사
